

PROJEKT PËR GARIM NË NIVEL LOKAL DHE REGJIONAL

LISTA KONTROLLUESE E PLANIT PËR MENAXHIM SOCIAL DHE TË MJEDISIT

TERASE VERORE AUTENTIKE ME KEND PER FEMIJE DHE SHIKIM NGA BUKURITE E SHARRIT

DHJETOR,2018

1. PARATHËNIE

Projekti për Garim në nivel Lokal dhe Regjional (PGLR) është investim katër-vjetor i mbështetur nga Unioni Europian dhe përdor fonde nga IPA II të parashikuara për garim dhe inovacione në Maqedoni. PGLR do menaxhohet nga fondi Hybrid Trust dhe përbëhet nga katër komponenta të zbatuara nga Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë. Projekti do sigurojë fonde për investim dhe rritjen e kapaciteteve për mbështetjen e sektorin për rritje, investime në destinacione dhe prosperitet të destinacioneve specifike. Në nivel lokal dhe regjional, projekti do të mbështesë destinacione të caktuara turistike të shtetit nëpërmjet kombinimit të asistencës teknike për t'a përmirësuar menaxhimin e destinacionit, investime në infrastrukturë dhe investime në krijimin e linjeve dhe inovacioneve. Investimi do të mbulohet nëpërmjet të grant skemes për turizmin regjional të palëve të interesuara siç janë komunat, institucionet, OJQ-të dhe sektori privat.

Lista Kontrolluese e këtij Plani për Menaxhim Social dhe të Mjedisit (PMSM) është përgatitur për aktivitete të zbatuara nga projekti i AGROPOLOG-VFS, Zhelina. Lista kontrolluese e PMSM paraqet përshkrim të projektit, detajet teknike, shtrirja, rregullimi dhe lokacioni, në bazë të të cilave vlerësohen rreziqet sociale dhe të mjedisit.

Implementimi i masave zbutëse që i adreson rreziqet e identifikuara dhe problemet, poashtu dhe plani monitorimit, i definuar me listen kontrolluese të PMSM, është e obligueshme dhe në pajtim me rregulloret nacionale për mjedisin dhe rregulloret tjera.

2. Përshkrim i shkurtër i projektit

Qellimi kryesor i nen-projektit “Terrase verore autentike me kënd për femije dhe shikim nga bukurite e Sharrit” është zgjerimi i ofertes së AGROPOLOG-VFS Zhelina me qëllim zgjidhjen e problemit të kapacitetit të vogël të terasës verore aktuale. Lokacioni është me truall dhe humus dhe momentalisht është i pambuluar. Në SITUACIONIN 1 janë dhënë fotot e situatës aktuale.

Hapat për implementimin e projektit janë si në vazhdim:

1. Zgjerim të terasës verore për të tjera 220m² (duke përfshirë replik të ures, ndertimin e një fontane në formë të mullirit antic, 24 tavolina dhe 80 karrike)

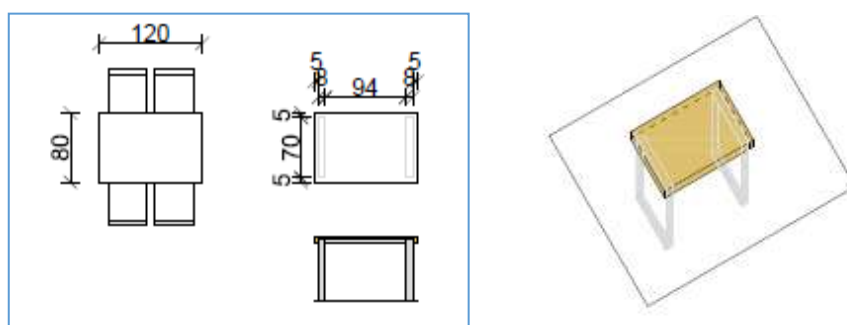


Foto 1. TAVOLINA

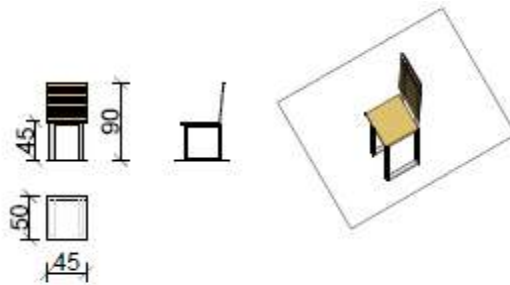


FOTO 2. Karike

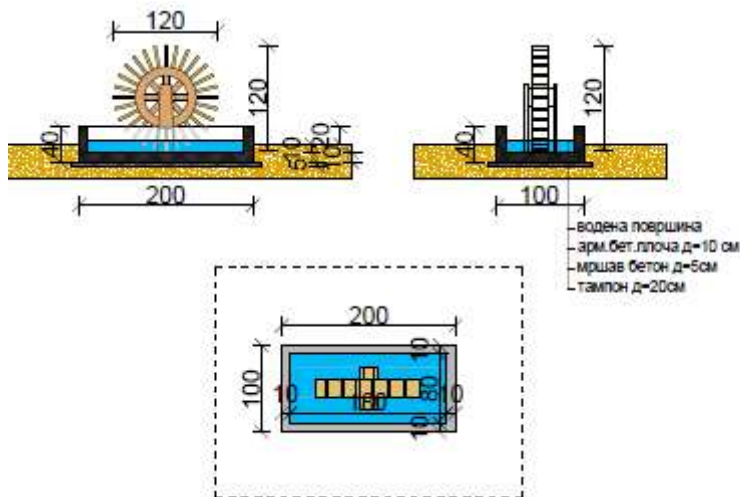


Foto 3. Fontana ne forme te mullirit antik

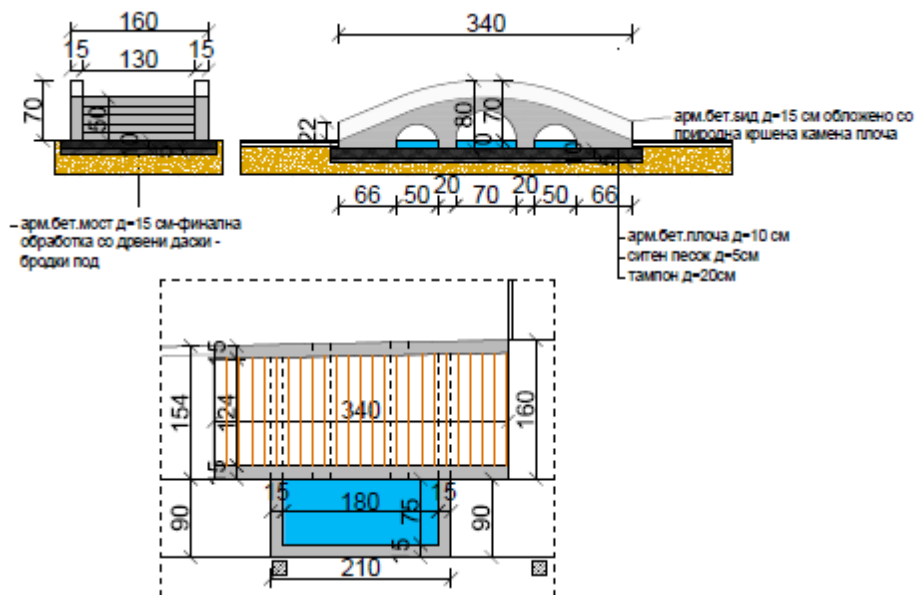


Foto 4. Replik e URES SE ZHELINES.



Foto 5. Dukja e terases para dhe pas zgjerimit.

2. Vazhdimi i banakut (Montim i banakut te jashtem me vendosjen e pajisjeve per banak dhe 4karrike)
3. Ndertim i kendit per femije ne kuader te lokacionit egzistues prej 20m² dhe instalim te lojrave per femije.

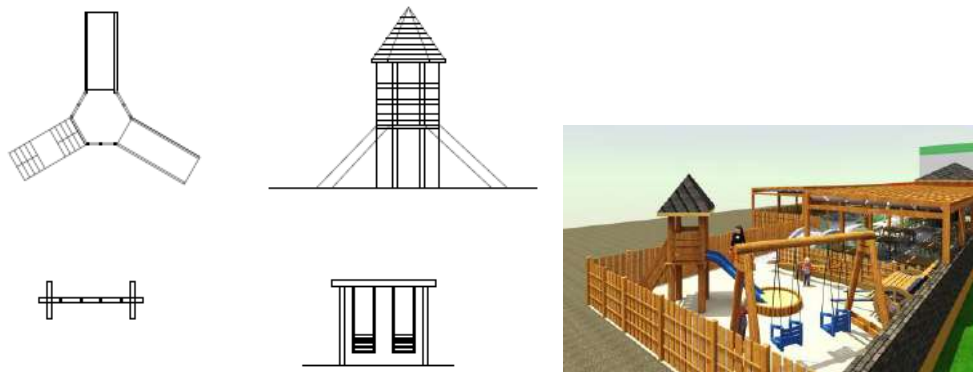


Foto 6. Lojerat per femije.

4. Ndertim i toaleti 2m² dhe dhoma per nena dhe femije prej 5.9m².

Aktivitetet e planifikuara jane te ndara ne disa kategori:

1.Pune pergaditore (bartjen e truallit-humusit aktual (220m²) dhe rrethimit aktual deri tek deponia ligjore)

2.Pune trualli

- Furnizim, transport dhe vendosjen e tamponit, d=20cm (45m²), zalle d=5 cm (15m³) dhe zalle shtese d=cm (40m³) per kend lojrash per femije per rafshimin e terenit per perpunim te metutjeshem te dyshemes

- aktivitetet hortikulturore dhe te cerdhes (vendosjen e shtreses nga humusi bashke me faren e barit per 40m², 30 drunj halor)

3. Pune ndertimtarie

- Nderitmi I murit prej tullave te betonit (20/40/20 d=20 sm dhe 4=120cm

- ndertimi I stazes per levizje d=10 cm dhe nje pjese se terces se mbuluar me plate te gurrit si pune perfundimtare dhe dysheme prej betony per lokacionin e parapare per stazen hyrese d=10 cm bashke me armaturen e nevojshme.

- Ndertimi I fontanes ne forme antike (detaje te dhena ne figuren 3)

- Nderitmi I I urres se improvizuar "Zheline" (detaje te dhena na figuren 4)

- Zgjerimi I banakut (h=1.20 m, h=1,50m, h=2,0m) dhe dekorimin me gurte dhe pllake keramike (d=05-1 cm)

- Nderitmi I nevojtores dhe dhomes ndihmese per femije. Tampon dhe beton per dyshemet prej 20m²

4. Pune te elektrikes

- Frunizim dhe montik te instalimeve elektrike tek banaku, teraca dhe hapsirat ndihmese (nevojtores dhe dhomes)

5. Furnizim dhe montim te rrjetit te kanalizimit dhe ujesjellesit tek banaku dhe hapsirat komunale (nevojtores)

6. Furnizim, transport dhe montim te derrasave ne konstrukcionin e pergaditur paraprakisht, vendosjen e konstrukcionit te drurit, karrikeve te drurit dhe derrasave te drurit

7. Furnizim dhe montim te pajisjeve (pajisjeve per dekorim te brendshem, tavolina, karrike, jastek dhe dekorime), pajisje per regullimin e kendit te lojrave per femije, pajisjeve per nevojtor per persona te hendikepuar dhe dhoma per nenat dhe femijet dhe pajisjeve per parkimin e bicikletave

3. Kategoria e mjedisit jetesor

3.1 Poitikat e e mbrojtjes te Bankes Boterore/kategorizimi

PGLR eshte e mbeshtetur nga granti prej Unionit European implemenetuar bashkarisht nga kabineti I zevendes premierit per ceshtje ekonomike si agjension implementues I fondeve dhe Banka Boterore. PGLR eshte klasifikuar si projekt

PGLR eshte klasifikuar si project I kategorise B, I cili nenkupton nje nivel te caktuar te ndikimit negative si rezultat I implementimit por asnje nga keta nuk ndikim te theksuar ne

mase dhe ne kohe te gjate. Si rezultat I ketij klasifikimi aktivizohet vleresimi I ndikimit ne ambientin jetesor OP 4.01. Rjedhismisht KZMEP perpunoj kornize per menaxhimin e ambientit jetesor dhe shoqeror (RUZHSHO) qe con drej analizes ekologjike ten en projekteve te mbeshetura perms skemes se granteve te Komponentes 3, definimin e pershtatshmeris dhe procedurave per skringing dhe vleresim te ambientit jetesor.

Te gjitha aktivitetet e projekti patjeter te realizohen ne pajtim me politikat operative dhe procedurat e Bankes Boterore dhe regullatives nacionale.

Nën-projekti i propozuar klasifikohet si Kategori B- për shkak të faktit që impakti në mjedisin jetësor në të ardhmen janë më pak të favorshëm sesa ato të Kategorisë A dhe B+, duke e konsideruar natyrën, madhësinë dhe lokacionin e tyre, si dhe karakteristikat e impaktit të tyre potencial mbi mjedisin jetësor.

Kjo kategori parashikon qëEA të vlerësojë çfarëdo impakti potencial të ambientit jetësor qëështë I lidhur me nën-projektin e propozuar, të identifikohen mundësitë potenciale për përmirësim të ambientit jetësor dhe rekomandim të çfarëdo masave të nevojshme për t'a parandaluar, minimalizuar dhe zvogëluar çdo impakt të demshëm. Përfshirja dhe formati i EA do ndryshojë varësisht nga nën-projekti, por në bazë do jetë me e ulët se shtrirja/përfshirja e EIA, zakonisht në formë të PMSM. Shtirja e PMSM-it është e definuar me Aneksin D të MKMSM. Për nën-projektet që involvojnë përmirësime, riparime dhe adaptime/përshtatje të vogla të objekteve, do të përdoret lista kontrolluese e PMSM (shablloni i dhënë ne Aneksin F prej MKMSM).

B- Kategoria do kishte përfshirë nën-projekte, të cilat poashtu: a. Involvojnë marrje hua kapital për punë, që përfshin blerje dhe/ose përdorim të materialeve të rrezikshme (psh. Benzinë) ore b. process irregullimeve që involvojnë blerje të pajisjeve/maqineri që paraqet potencial per rrezik të madh të shëndetit dhe sigurisë. Sipas ligjeve të Maqedonisë, tipet e nën-projekteve që binë në kategorinë B-, nuk kërkojnë EIA. Aktivitetet e parashikuara me këtë projekt e që mund të shkaktojnë ndikim negativ në mjedisin jetësor, janë të obliguara të zbatohen ndër Komponentën 2 (infrastruktura të buta dhe riparim I skaut kampit Krste Jon në Strugë me qëllim zgjërimit). Megjithatë, këto aktivitete pritet të prodkojnë impakteve të limituara, kohëshkurta dhe tipike mbi ambientin jetësor

3.2 Vlersimi I ambientit jetesor sipas legjislatives nacionale

Nen-projekti nuk ben pjese ne asnje prej kategorive te Aneks I dhe Aneks II te Rregullores per percaktimin e projekteve dhe krijimtarive ne baze te se cilave kerkohen procedur per vlersimin e ambientit jetesor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 2005, nr. 109/2009). Ne pajtim me Udhezuesin per realizimin e procedurave per vlersimin e nevojës, vellimit dhe vlersimin e ndikimit mbi ambientin jetesor, ku project nuk bie as ne Aneks I as ne Aneks II, Vendimi per procedure per vlersimin e nevojës per Vleresimin e ndikimit ne ambientin jetesor eshte I panevojshem.

Si do qe te jetes sipas udhezimeve te PKLR, ne suaza te Raportit per kontrollin e ambientit jetesor, parashtruesi I kerkeses ka dorezuar njoftim dhe qellim per realizim te projektit ne Ministrin e ambientit jetesor dhe planifikim hapsinor. Agropolog-VFS Zhelines, dorezoi njoftim me shkrim deri te Ministrie e ambientit jetesor dhe planifikimit hapsinor dhe mori pergjigje me date 10.08.2018 vj me mendim se duhet process per VNAJ dhe pergaditi elaborate per mbrojtjen e ambientit jetesor per realizimin e ketij nen projekti.

Pergjigja e mare nga ana e Ministris se ambientit jetesor dhe planifikimit hapsinor do te jete ne shtojce te Listes kontrolluese e planit per menaxhimin me ambinetin jetesor dhe shoqeror.

4. PASQYRA E NDIKIMEVE

Si rezultat I aktivitetete te parashikuara te projektit per renovim/adaptim te terraces verore nga aNa e Agropolog-VFS Zheline, jane identifikuar Ndikimet potencijale si ne vijim:

1. Ndikime te mundeshme negative ne siguri dhe shendet ne pune dhe ndikimet tek banoret, vozitersit dhe punetoret(ndikimiet locale jane tekufizuara ne lokacionin e renovimit dhe jane afatshkurtera, prezente vetem gjate fazes se implementimit)per shkak te:
 - Mungesa e masave per siguri dhe shendet ne pune gjate periudhes se renovimit/adaptimit,
 - Lendimet e e shkaktuara ne/afersi te punetorise,
 - Mos respektim te standardeve per siguri dhe procedurave te punes,
 - Menaxhim jo adekuat te komunikacionit dhe siguri e udhetareve

2. Ndikimi I mundshem ne kualitetin e ajrit dhe emetimin e gazrave prej automjeteve te cilat transportojn materijale dhe pajisje ne lokacionin e nen projektit dhe transportin e mbeturinave jashta lokacionit (ndikim local I kufizuar ne lokacionin e renovimit/adaptimit I cili paraqitet ne fazen e implementimit per shkak te:
 - emetim I pluhurit gjate trasportit te materijaleve, menaxhim me materijale dhe pune ndertimore,
 - gazra prej automjeteve dhe komunikacionit, gjithashtu edhe ndryshim I kursit te komunikacionit ne afersi.

3. Emetim I mundshem I vibracioneve si rezultat I automjeteve transportuese te cilat qarkullojn ne lokacionin e renovimit, sikur edhe vete punet ndertimore (ndikimet locale jane te kufizuara vetem ne lokacionin e renovimit dhe gjate fazes se implementimit.

4. Menaxhim I pa pershtatshem te mbeturinave dhe I grumbullimit jo ne kohe te tyre, si dhe transporti I te njejtave. Efektet e mundeshme te padeshiruara ne ambientin jetesor dhe te shendetit mund te dalisn si rezultat I gjenerimit dhe menaxhimit te llojeve te ndryshme te mbeturinave. Ekziston mundesia qe ndikimet negative te jene afatgjata dhe te perseritshme por te kufizuara me menaxhin joadekuat te mbeturinave dhe grumbullimin dhe transportimin jo ne kohe te mbetjeve komunale.

6. Ndikim ne token pjellore dhe ne ujrata si rezultat I rjedhave te rastesishme, derdhje dhe ndertimm jo adekuat dhe menaxhim me mbeturina te demshme. Megjithate, nga aktivitetet e parapara pritet te kete ndikim negativ te perkohshem, local, afatshkurt dher te kufizuar gjate periudhes se renovimit/adaptimit. Sasit e priotutra te mbeturinave te fort ate rezikshme dhe rrjedhjeve te clat gjenerohen si mbeturina gjate implemntimit ten en projektit jane te vogla.

Nuk priet asnjë ndikim negativ tek resurset kulturore dhe venbdanimet natyrore, sepse nen projekti nuk gjendet ne afersi te vedeve te mbrojtura.

Skriningu fillestar tregoi qe nuk do te gjenerohet mbeturine te azbestit dhe mbeturina radioactive, megjithate jane parapare masa per zbutje ne kete nen project.

5. QËLLIMET E LISTËS KONTROLLUESE TË PMSM, PËRSHKRIM I KËRKESAVE

Banka Botërore kërkon Vlerësim të Mjedisit (EA) për propozim-projektet që konkurojnë për fondet e Bankës Botërore, me qëllim që projektet të jenë të sigurta dhe të përshtatshme në pikëpamje të mjedisit jetësor dhe kështu të rritet kualiteti i sjelljes së vendimeve. EA është i propozim-projektit të ketëndikim mbi mjedisin jetësor.

Sipas ekzaminimit të aplikacionit për shprehje interesimi (këtu duke përfshier dhe Pyetësin për Mbrojtje të Mjedisit) nën-projekti “Turizëm i aventurave rinore” u kategorizua si B-. Nën projektet që kategorizohen si B- janë ato ku impakti mbi mjedisin është më pak i dëmshëm sesa nën-projektet të kategorizuara si A ose B+, këtu duke marrë parasysh natyrën, madhësinë dhe lokacionin, e poashtu dhe karakteristikat për impakt potencial mbi mjedisin.

Thellësia e vlerësimeve të ambientit për nën-projektet mund të jetë e ndryshme varësisht nga nënprojekti, por zakonisht është më pak rrenjësores sesa EIA, më shpesh në formë të Planit për Menaxhim Social dhe të Mjedisit jetësor (PMSM). Për nën-projektet që parashikojnë përmirësime, rikonstruime dhe përshtatje të thjeshta të pajisjeve, përdoret Lista Kontrolluese e PMSM.

Lista Kontrolluese e PMSM aplikohet për riparime ose ndërtime të lehta. Siguron “praktikë të mirë pragmatike” dhe është e dizajnuarë ashtu që të jetë lehtë e përdorshme dhe kompatible me kërkesat mbrojtëse të Bankës Botërore. Format i kësaj liste përpiqet tëmbulojë qasje të lehta të punimeve të përditshme civile me impakt të lokalizuar.

Lista kontrolluese përmban një paragraph parathënie (paragraph I parathënies, në të cilin përshkruhet projekti, pjesë në të cilën definohet kategoria e mjedisit, identifikohen impaktet dhe shpjegohet koncepti I PMSM listës kontrolluese)

Pjesa 1 përbëhet nga pjesa përshkruese (“pasaporta e faqes”) që shpjegon specifikat e projektit në aspekt të lokacionit fizik, aspektin institucional dhe legjislativ, shpjegim I projektit, përfshier këtu dhe nevojën për ndërtim të kapaciteteve të programit dhe shpjegim të procesit të kyqjes dhe konsultimit të qytetarëve.

Pjesa 2 përfshin ekzaminim social dhe të mjedisit në format të thjeshtë me Po/Jo, i përcjellur me masa për zbutje të çdo aktiviteti të dhënë.

Pjesa 3 është plan për monitorim për aktivitetet gjatë ndërtimit dhe implementimit të projektit. Mban të njëjtin format të kërkuar nga standardet PMSM të Bankës Botërore.

Qëllimi i kësaj liste kontrolluese është që Pjesa 2 dhe Pjesa 3 të përfshihen në dokumentet e ofertave të kontraktuesve.

Procedura për botimin e Listës Kontrolluese të PMSM është: Listë Kontrolluese e PMSM në gjuhën Maqedonase, Shqipe dhe Angleze duhet të publikohet në faqen e internetit të PGLR e poashtu dhe në faqen e internetit të komunës në fjalë, dhe duhet të jetë e hapur për publikun së paku 14 ditë.

Duhet të jetë në dispozicion si kopje e printuar në hapësirat e PMSM dhe komunës relevante dhe/ose në qendrat regjionale të planifikim. Gjatë shpalljes, thirrja për vërejtje ndaj dokumenteve duhet të leshohet megjith adresën elektronike dhe postale për t’i dërguar vërejtjet. Raporti I dëgjimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përmban informata bazë për

vendin, listë të personave prezent dhe përmbledhje të vërejtjeve të pranuar. Kjo duhet të përfshihet në verzinin final të dokumentit të publikuar.

6. APLIKIMI I LISTËS KONTROLLUESE TE PMSM

Lista kontrolluese PMSM është document I pregaditur dhe ne pronesi te shfrytezuesit. Procesi I dizajnit dhe implementimit te projektite te parashikuar do te behet ne tre faza::

1. Identifikim general dhe faza e studimit, në të cilën objekti i rekonstruimit dhe përshtatjeshtëi selektuar dhe programi përafërt për tipologji të punës potenciale, janë të elaboruara. Në këtë fazë, Pjesa 1, 2 dhe 3 e Listës Kontrolluese të PMSM, janë të hartuara. Pjesa 2 e Listës Kontrolluese të PMSM mund të përdoret për selektimin e aktiviteteve tipikë prej “meny”-së dhe të lidhen me probleme tipike të ambientit jetësor dhe masa për zbutjen e tyre. Bëhen konsultimet publike dhe pastaj PMSM është i finalizuar.

2. Planifikimi detaj dhe faza e tenderit, duke përfshirë dhe specifikimet dhe faturat për punime ndërtimi, mallëra për pajisje, marketing dhe shërbime tjera të lidhura me nën-projektin. Gjithë PMSM i plotësuar (Pjesa 1, 2 dhe 3) do të bashkangjitet në pjesë integrale të dokumentacionit të ofertës së bashku me kontratën e punës dhe kontratën për supervision, analog me kushtet teknike dhe komerciale, duhet të jetë e nënshkruar nga palët që lidhin kontratën.

3. Gjatë implementimit të fazës së punës nëpajtueshmëri me mjedisin jetësor (me Listën Kontrolluese të PMSM megjithë rregulloret shëndetësore dhe sigurisë (Sh&S)- environmental and health and safety (H&S) së njerëzve dhe mjedisit jetësor) dhe kriteret tjera kualitative, janë të implementuara në vendet përkatëse, dhe aplikim i tyre i kontrolluar/mbikqyrur nga mbikqyrës rajonal. Këto përfshijnë enxhinier mbikqyrësi (supervisor) rajonal ose mbikqyrës të caktuar nga projekti Lista Kontrolluese e PMSM dhe implementim të mbikqyrjes. Masat e zbutjes së ndikimit në Pjesën 2 dhe plani I monitorimit në Pjesën 3, janë bazat për të verifikuar pajtimin e palëve që lidhin kontratë me provizionet e duhura të mjedisit jetësor.

Aplikimi praktik i Listës Kontrolluese të PMSM do përfshijë dhe arrijtjet e Pjesës I, dokumentimi I specifikave relevante të vendit në fjalë. Në pjesën e dytë, aktivitetet që duhet të ndërmerren, do kontrollohen në bazë të llojete vë aktiviteteve të parashikuara dhe në bazë të parametrave të monitorimit nga pjesa e tretë (Pjesa 3), do definohet dhe aplikohet në bazë të aktiviteteve të paraqitura në Pjesën 2. E gjithë Lista Kontrolluese e PMSM e plotësuar në tabelën 1 (Pjesa 1, 2 dhe 3) për çdo lloj të punës, duhet të jetë e bashkangjitur si pjesë integrale e kontratës së punës dhe si analog me gjithë kushtet teknike dhe reklamuese, e cila duhet nënshkruar nga palët që lidhin kontratën.

7. MASAT E ZBUTJES SË NDIKIMEVE

Masat për shmangjen dhe zvogëlimin e ndikimeve të identifikuara në mjedisin jetësor, punëtorët dhe komunitetin, sidhe aplikimi i aspektit social të nën-projektit janë këto (por jo të limituara me kaq):

Shënimi i vendit për rekonstruim, shënimi i kolacinit të duhur për depo të përkohshmetë materialeve për punime ndërtimi, përdorimi i shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim, ndalesë të hyrjes për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet paralajmëruese, aplikimi i masave të sigurisë për qytetarët, maqinat të mund të përdoren vetëm nga kuadri I trajnuar dhe me eksperiencë, prezencë konstante e aparateve kundër zjarrit në rastë zjarri ose dëme tjera, veshja e pajisjeve dhe rrobave sigurie gjatë gjithë kohës, rregullim

të skeleve (tribunave) dhe masa tjera shëndeti dhe sigurie. Lëngjet e djegshme mund të vendosen dhe ruhen ekskluzivisht nëpër anijet e dizajnuara mu për këtë qëllim.

Gjithë punëtorët duhet qenë të vetëdijshëm për rrezikun nga zjarri dhe masat për shuarjen e zjarrit. Duhet trajnuar për përdorimin e aparateve për fikjen (shuarjen) e zjarrit, hidrantët dhe pajisjet tjera për fikjen e zjarrit, të cilat duhet qenë funksionale. Niveli i zhurmës nuk duhet kapërcyer 55dB gjatë ditës, kursë punimet e ndërtimit, nuk do bëhen gjatë natës. Identifikimi, klasifikimi dhe ndarja e llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen gjatë riparimit, duhet trajtuar në mënyrë të duhur, nëpër depo të ndryshme (në kontejnerë të pastër të shënuar në vend paraprakisht të definuar në hapësirë dhe në numër të mjaftueshëm). Mbeturinat mund të transportohet dhe procesohet vetëm nga kompani të licencuara. Duhet krijuar regjim special të trafikut për automjetet e kontraktorëve gjatë periudhës së revitalizimit, me shenja të duhura sinjalizimi. Nënshkruarja e kontratave me kompanitë e shërbimit për mirëmbajtje të vazhdueshme, ndrim të pjesëve rezervë, ndrim të vajërave lubrikantë, mirëmbajtje e duhur (pajisje makinash, psh. Frena, goma, e tj.) si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, e tj, larje e rregullt e automjeteve dhe mirëmbajtje e pastrim të vendit për parkim, ndalesë për ndërrim të vajit të motorit në vendin për parkim, me qëllim që t'i shmangët ndotjes së ujit dhe tokës, performim i rregullt i testeve për aprovim gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve. Masat zbutëse të ndikimeve të dëmshme mbi mjedisin jetësor në këtë paragraf janë gjenerale, masat detaje të detyrueshme për zbutje të ndikimeve, janë të siguruara në tabelen Lista Kontrolluese e Masave për Zbutje të ndikimeve mbi Mjedisin jetësor (Pjesa 3).

8. MONITORIMI DHE RAPORTIMI I PROCEDURAVE DHE SHPËRNDARJE E PËRGJEGJËSIVE

Për monitorimin e implementimit të Listës Kontrolluese të PMSM për kontraktuesit, mbikqyrësi ose personi përgjegjës i caktuar për mbikqyrje të vendit (në raste kur nuk ka nevojë për angazhim të mbikqyrësve inxhinierë; supervisor i vendit në tekstin e mëposhtëm) do punojë me Pjesën e 2të dhe 3të të Listës Kontrolluese të PMSM, qdth. Plani i monitorimit. Pjesa 2 dhe 3 është e paraqitur me detaje. Duke definuar masa të qarta për zbutje të ndikimeve dhe monitorim që mund të përfshihet në kontratat e punës. Kjo reflekton statusin e praktikave ekologjike në vendin e punimeve, që mund të observohet/matet/ kuantifikohet/ verifikohet nga supervisorët (mbikqyrësit) gjatë procesit të punës. Pjesa 3 praktikisht reflekton kriteriumet kyqje të monitorimit të cilat mund të kontrollohen gjatë dhe pas punimeve për pajtueshmëri të kushteve të sigurisë dhe më në fund pagesë të kontraktorëve.

Kontratat e tilla për zbutje të ndikimeve negative mbi ambientin, përfshijnë, por nuk janë të limituara vetëm në, përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMP) për punëtorët në vendndërtim, parandalim i mbledhjes së pluhurit, sasi të ujit dhe lëshimi i tyre në vend-punim, trajtimi i ujërave tëndotur, prezenca e objekteve të duhura për pastrim të punëtorëve, mbledhje e llojeve të ndryshme të mbeturinave (dru, metale, plastikë, mbeturina shkatërruese, psh. Mbetje të ngjyrave, vajëra të harxhuara për motor), sasi të plehrave, organizimii duhur i vendkalimeve dhe objekteve për hedhje të mbeturinave, ose ripërdorimi dhe reciklimi çdokund ku është e mundur. Si shtesë e Pjesës 3, mbikqyrja e vend-punimit, duhet të shihet punëtorët (kontraktuesit) a punojnë në pajtueshmëri më masat për zbutje të ndikimeve negative mbi mjedisin, të përshkruara në Pjesën 2. Raportimi dhe implementimi i praktikave duhet të shpjegohet në raport të rregullt në PIU. Raportii praueshëm monitorimi nga kontraktuesit ose mbikqyrësi i vend-punimit, do jetë kusht për pagesë të plotë e përkrahur me kontratë për pagesë, poashtu dhe kriteriumi i kualitetit Teknik ose kualiteti i analizës (shqyrtimit). Raportimi në implementimin e Listës Kontrolluese të PMSM do bëhet në çdo tremujor. Për të siguruar një nivel të përkrahjes në performancën ekologjike të lidhësit të kontratës (punëtorët në objekt), në kontratë të punës do futet si nën i veçantë që do specifikojnë ndëshkimet në rast se nuk

përbushen kushtet për provizionet ekologjike, psh. Në formë të ndalimit të një sasive të pagesës deri në momentin kur do merren masa për korrigjim dhe në pajtim me nënprojektin, madhësia e tij në varësi prej nivelit të mosrespektimit të kontratës. Për raste ekstreme, ndërprerje të kontratës, që duhet specifikuar në vet kontratën. Masat e definuara për implementimin e Listës Kontrolluese të PMSM, do monitorohen nga mbikqyrës/mbikqyrës enxhinier (supervisor), Komuna e Zhelinas/ inspektorë komunal.

Implementimi i masave do ndiqet para fillimit të punës, gjatë rekonsruimeve dhe pas përfundimit të tyre.

Konkuresi (konkuresit/aplikantët) ëahtëi detyruar të dërgojë raporte tremujore për implementimin dhe monitorimin e masave për zbutje të ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor (psh. Në formë të tabelave përshkruese -tabelë me plan të zbutjes dhe monitorimit) me kolonështesë që jep statusin dhe masat, observimet dhe komentet, dhe monitorim të masave (të implementuara/ jo të implementuara, rezultate, observime, komente, çështje/shqetësime, kohëzgjatje, e tj.)

pjesa 1: Kapacitetet administrative dhe institucionale	
Vendi	Republika e Maqedonise
Име на потпроектот	“Terrase verore autentike me kend per femije dhe shikim nga bukurite e Sharrit”
Vellimi I nen projektit dhe aktivitetet	Menaxhim dhe koordinim I nen projektit Rekonstruimi I terraces veror Furnizim dhe vendosje e pajisjeve dhe rregullimi funksional I objektit Ndertimi I kendit te lojrave epr femije
Marreveshjet Institucionale (Emri dhe kontakti)	Menaxhimi I projektit
	<u>Investues</u> :AGROPOLOG – VFS Zheline Tel: 044-347-777 E-majl: agropolog@t.mk <u>Koordinator I projektit</u> : ferdi Xhaferi
Marrëveshjet për implementim (Emri dhe kontakti)	Mbikqyres **
Pershkrimi I lokacionit	
Emri I lokacionit	Autostrada Tetove-Shkup, para pikes pagesore
Опис на локацијата	<p>Aneks 1: Informacione per lokacionin (foto nga lokacioni)</p> <p>Lokacioni I nen projektit eshte autostrada Tetove-Shkup, para pikes pagesore ne kuader te komunes se zhelines. Komuna katastrale KO Zheline, parcela katastrale KP 964. Objekti eshte I vendosur perkrah autostrades en anen e djathte dhe nuk eshte I vondosur ne zone kembsorie. Ne njeran ane ekziston qasje direct ne object kurse ne anen tjetet eshte I rethuar me toke nderitmore</p>
Kush eshte shfrytezues I fundit?	AGROPOLOG – VFS Zheline
Географски опис	<u>Vendi</u> RM <u>Regjioni</u> : Regjioni I Pollogut <u>Komuna</u> : Zheline
Legjislacioni	
Identifiko legjislativën nationale dhe lokale dhe lejet që kërkohen për nën-projektin	□ Ligji pern dertim (Gazeta zyrtare e RM nr.. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137 /13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16)

	<ul style="list-style-type: none"> □ Ligji per mjedisin jetesor ((Gazeta zyrtare e RM nr 6p.53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,51/11, 123/12,93/13,187/13, 42/14, 44/15,129/15, 192/15 и 39/16) □ Ligji per ujrat (Gazeta zyrtare e RM nr.. 87/08, 6/09,161/09, 83/10, 51/11,44/12,23/13,163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); □ Ligji per menaxhim me mbeturinat (Gazeta zyrtare e RM nr.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/11,51/11,123/12 и 163/13); □ Rregullora per menyren e procedimit te mbetjeve koimunale dhe lloje tjere te mbetjeve te rezikshme (Gazeta zyrtare e RM nr. 147/07); □ Ligji i paketimit dhe Menaxhimi i Mbeturinave nga Paketimi (Gazeta zyrtare e RM nr. 161/09, 17/11,47/11,136/11,6/12,39/12 и163/13); □ Lista e llojeve te mbetjeve (Gazeta zyrtare e RM nr 100/05); □ Ligji per kemikale (Gazeta zyrtare e RM nr. 145/10 и 53/11); □ Ligji per kualitetin e mbetjeve ambientale (Gazeta zyrtare e RM nr . 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 и 10/15); □ Ligji per mbrojtje nga zhurmes dhe ambientit (Gazeta zyrtare e RM nr.79/07, 124/10 и 47/11); □ Rregullore për lokacionin e nënstacioneve dhe pikët për matje (Gazeta zyrtare e RM nr 147/08); □ Vendim për determinimin e asaj që në cilat raste dhe nën çfarë kushte konsiderohet qetësia e qytetarëve kundrejt zhurmës së dëmshme ("(Gazeta zyrtare e RM nr 1/09); □ Ligji per mbrojtje te ambientit (Gazeta zyrtare e RM nr 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,148/11,59/12,13/13,163/13 и 41/14); □ Ligji per mbrojtje dhe shpetim (Gazeta zyrtare e RM nr 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11); □ Ligji per siguri dhe shendet ne pune (Gazeta zyrtare e RM nr 92/07, 136/11, 23/13и25/13)
--	--

Debat publik	
Identifiko kur/ku u mbajt procesi i	Procedura për publikimin e Listës Kontrolluese të PMSM

<p>konsultimit të qytetarëve dhe cilat ishin vërejtjet nga palët e interesura/ndiku ara.</p>	<p>është si vijon: Lista Kontrolluese e PMSM duhet të publikohet në faqen e internetit të PGLR dhe pranuesi i shërbimit, poashtu dhe internet faqja e komunës së ndikuar me projektin. Qytetarëduhet patur qasje në dokumentin së paku 14 dite. Kopje e printuar e dokumentit duhet të qëndrojë në zyret e PMSM dhe komunat relevante dhe/ose në qendrat e regjioneve të planifikuara. Kur publikohet, thirrja për vërejtje mbi dokumentet duhet të nxirret bahskë me adresën elektronike dhe postale të dërguesit të vërejtjeve. Raporti I dëgjimit/shqyrtimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përfshijnë informatat bazike për vendin, lista e prezantuesve dhe përmbledhje e observimeve të mbledhura dhe duhet të përfshihet në verzionin final të dokumentit të publikuar.</p>
<p>Ngritja e kapaciteteve instituconale</p>	
<p>A parashikohen ngritje te kapaciteteve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Н или <input type="checkbox"/> Да ако Да, Ne Aneks 2 jane dhen informacione per ngritje te kapacitetve</p>
<p style="text-align: right;">Табела 24</p>	

Pjesa 2: Skrining ekologjik/social

Aktivitetet në këtë vend a përfshijnë/ involvojnë ndonjë nga:	Aktiviteti	Status	Referenca shtesë
	A. Kërkesa gjenerale	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shikoni ne pjese A me poshte
	B. Renovim/adaptimi I objktit	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shikoni ne pjese A dh B me poshte
	C. Konstrukcin I vogel	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shikoni ne seksionet A dhe C me poshte
	D. Materiajel te rezikshme ose toksike	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shikoni ne seksionet A dhe D me poshte
	E. Komunikacioni dhe siguria e kembesoreve	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shiko seksioni A, B dhe E me poshte
	F. Furnizimi I hemikaljeve	x Po <input type="checkbox"/> Jo	Shiko pjese F me poshte

Табела 2

LISTA KONTROLLUESE E MASAVE PËR MBROJTJTE TË NDIKIMEVE TË DËMSHME

Aktiviteti	Parametra	Lista kontrolluese e masave per mbrojtje te ndikimeve te demshme
A. Kushtet gjenerale	Njoftim per siguri ne pune	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurim të informative për qytetarët lokal për madhësinë, kohën e nisjes dhe kohëzgjatjes së aktiviteteve të ndërtimit, dukë përgatitur Njoftim që do vendoset në tabelën e shkresave të skaut grupit dhe komunës, dhe në faqen e Facebook-ut, sidhe mediat tjera sociale dhe mënyra tjera, në rast nevojë, për t'u siguruar që popullata lokale janë mirë të informuar; • Inspektorët për ndërtime lokale dhe mbrojtje të mjedisit janë të informuar para fillimit të projektit; • Gjithë lejet/ mendimet/ vendimet e duhura e tj, janë të përfunduara para fillimit të punës (duke përfshier ndërtimet e tjera); • Gjithë puna do kryhet në mënyrë të sigurtë dhe të disiplinuar; • Rrobat dhe pajisjet e sigurise për punëtorët do jenë të siguruara në numër të duhur dhe gjatë gjithë kohës punëtorët do kenë qasje deri tek to; • Gropat e hapura do të mbyllen dhe do shënohen qartë kur nuk punohet në to; • Të sigurohet tabelë për njoftim dhe shënim ne vendin e rikonstruimit; • Markim/ shënim për depo të përkohshme të materialeve për ndërtim afër vendit të ndërtimit; • Përdorimii shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim për paralajmërim të rrezikut, rregulla dhe procedura që duhet ndjekur; • Ndalesë e hyrjes për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet paralajmëruese dhe gardhe kudo/kurdo që nevojitet; • Rrethina afër skaut kampit duhet të mbahet e pastër; • Maqinat të mund të përdoren vetëm nga kuadër i trajnuar dhe me eksperiencë, kështu të zvogëlohet rreziku nga aksidentet;

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

		<ul style="list-style-type: none"> Gjithë punëtorët duhet të jenë të njoftuar me shkaktuesit e zjarrit dhe masat për mbrojtje nga zjarri. Duhet trajnuar se si të përdorin aparat për fikje të zjarrit, hidrantë dhe pajisje për fikje të zjarrit; Aparatet dhe pajisjet për fikje të zjarrit duhet gjatë gjithë kohës të jenë funksionale, që në rast nevojë të mund të përdoren shpejtë dhe në mënyrë efikase. Kutitë për ndihmë të parë dhe personeli i trajnuar duhet të ketëqasje deri te to. Procedurat në raste emergjence (duke përfshier aksidente, derdhje e tj.) janë të disponueshme në vend. Tualetet e levizshme duhet të vendosen në vend-ndërtim (nëse nuk përdoren tualetet e skaut kampit) dhe duhet të mirëmbahen nga kompania e çertifikuar. ж) Обезбедени се соодветни ознаки и информативна табла за локацијата на реновирање;
	<p>Zbulime te rastesishme</p>	<ul style="list-style-type: none"> Procedurat do ti ndjekin ligjet nacionale per zbulime te rastesishme Ne rast se ka zbulime te rastesishme, punet do te nderpriten dhe do te informohet organi competent (Ministria e cultures) ne afat prej 24 oresh Njoftuesi me tutje do te ndjek udhezimet e organit competent dhe punet do te iflojn pasi te meret leje; Hapsira punuese, kampi I lokacionit etj, duhet te alokohen sa me larg trasehgiemis kulturore dhe zbulimebe arkeologjike; Duhet nje kujdes adekuat dhe ngritj te vetedijes qe te ju sqarohet punetoreve te ndertimit per gjetjen e mundeshme te mbetjeve arekologjike;
	<p>Kualiteti I ajrit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Punetoria, rruget per transport dhe vendet per menaxhim me materijalet te vaditen me uje ne ditet e that dhe me ere Materijalet ndertimore te rruhen te mbuluara ne vende adekuate me qellim te parandalimit te pluhuri Automjetet transportuese nga te cilat del pluhur te mbulohen. Kufizimi I shpejtesis se automjeteve ne lokacionin ku realizohet rekonstruimi. Rruget rregullisht te fshihen ne vendet kritike.

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

		<ul style="list-style-type: none"> • Mbani shtresen e sipërme nga të tokës dhe rezervat në mënyrë të ndarë • Mbuloni me mbulës në raste të kohës me erë. • Vendosni rezervat me largësi nga rrjedhat e ujërave, ujrat natyrore dhe vendet e ekspozuara ndaj erozionit. • CTe gjitha ngarkesat duhet të mbulojnë kur dergojnë në lokacionin e ndërtimit.
	<p>Zhurma</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Për shkak se lokacioni gjendet në zonë banimi, niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë mbi 55dB gjatë ditës dhe mbrëmjes dhe 45dB gjatë natës. • Punimet ndërtuese nuk do lejohen gjatë natës, punimet në zonën e kampit duhet të kufizohen prej orës 7.00 deri në orën 19.00 (e miratuar në leje). • Gjatë punimeve, motorët e gjeneratorëve, kompresorët e ajrit dhe pajisjet tjera mekanike, duhet të jenë të çkyqura, dhe pajisjet të vendosen sa më larg që është e mundur nga zona e banimit. • Pompat dhe pajisjet tjera mekanike duhet të mbikqyren në mënyrë efektive.
	<p>Kualiteti I ujit dhe tokës</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vijnë nga mbeturinat (depot e përkohshme të mbeturinave duhet të jenë të mbrojtura nga rrjedhjet dhe ato që paraqesin mbeturina toksike shkatërruese, të pajisura me sistem sekondar të kontrollimit, psh. Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur) • Në rast se paraqitet rrjedhë e rrezikshme, ndalojeni dhe largojeni atë, pastrojeni zonën dhe ndjekni procedurat dhe masat për menaxhim të materialeve shkatërruese (të rrezikshme). • Në rast se vie deri tek derdhje e substancave të kontaminuara ose të rrezikshme nga rajoni i punimit, duhet të mblidhet në bazen mbajtëse dhe duhet transportuar në fabrikë adekuate të licencuara, për trajtimin e ujërave të zeza • Derdhjet e munshme të materieve të rënda nga vendi i ndërtimit, duhet filtruar para lëshimit në rrjedha natyrore (por lëshimi në liqenin e Ohrit është rreptësisht i ndaluar). • Të sigurohet që uji që lëshohet në rrjedhitë natyrore, asnjëherë nuk i tejkalon standardet e rregullores për kualitetin e ujit me teste të rregullta.

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

		<ul style="list-style-type: none"> • Instalimi dhe mirembajtja e objekteve sanitare për punonjësit. Uji i ndotur nga këto burime duhet transportuar në objekte për trajtim të duhur të ujërave të ndotur. • Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vinë nga rezervuarët (sistemi sekondar i kontrollimit është obligueshëm, psh. Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur), pajisjet dhe automjetet për ndërtim (mirëmbajtje dhe kontrolim i rregullt i vajit dhe rezervuarit të benzinës, makinat dhe automjetet mund të parkohen vetëm në sipërfaqet e asfaltuara ose betonuara me sistem të mbledhjes së derdhjeve të ujërave të ndotur. • Uji dhe komponentat tjera në përzierjet e betonit, duhet të jetë pastër dhe pa hemikalje të dëmshme.
	<p>Menaxhimi I mbeturinave</p>	<p>Do aplikohen praktikat për menaxhim të duhur të mbeturinave/plehrave, këtu përfshirë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikimi i tipeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen në vend-punim dhe klasifikimi i tyre sipas Listës Nacionale për klafikim të mbeturinave (Gazeta Oficiale no.100/05); • Duhet siguruar kontejnerë për çdo kategori të identifikuar të mbeturinave, në sasi të mjaftueshme dhe duhet pozicionuar në vende të përshtatshme. • Për çdo tip të mbeturinës që priten sasi më të mëdha nda demolimi, renovimi dhe aktivitetet e ndërtimit, duhet identifikuar bledhja e tyre, rrugicat për hedhje të tyre, fabrikat e licencuara për trajtim të tyre. • Mbeturinat minerale nga ndërtimi dhe demolimi, duhet ndarë nga mbeturinat tjera gjenerale si plehra, mbeturina organike, mbeturinat në gjendje të lëngët dhe hemikaljet duhet të ndahen, dhe përkohësisht të ruhen në kontejnerë të duhur. Varësisht nga origjina dhe përmbajtja, mbeturinat minerale do ripërdoren. • Gjithë mbeturinat e ndërtimit do mblidhen dhe hidhen në mënyrë të duhur nga kolektorë (mbledhës) të licencuar dhe nëpër fusha të licencuara (ose fabrika të licencuara për trajtim të mbeturinave) • Raportet për hedhje të mbeturinave do rishikohet rregullisht dhe do mbahet si vërtetim për menaxhim të duhur, ashtu si ç'është e paraparë. • Kurdo që do jetë e mundur, kontraktuesi do i ripërdor dhe reciklojë materialet ku reciklimi ose ripërdorimi është zbatueshëm dhe i përshtetshëm. Hedhja e çfarëdo lloji të mbeturinave (duke përfshier mbeturina organike) ose ujë të ndotur në natyrën ose ujërat përreth, është rreptësisht e ndaluar.

Lista e masave për kontroll dhe zbatim

		<ul style="list-style-type: none">• Mbledhja, transporti dhe trajtimi final i mbeturinave komunale do bëhet nga kompani e licencuar.• Mbaturnat nga ndërtimi duhet shpejtë të largohen nga vend-punimi dhe poqëse është e mundur, të ripërdoren.• Djegia e çfarëdo lloji të mbeturinave në atë zonë ose në fabrika dhe fusha të palicencuara, është e ndaluar.
	Sigurimi I komunikacionit	<ul style="list-style-type: none">• Përpilohet dhe zbatohet plan për rregullimin e komunikacionit në pajtim me komunën dhe organet tjera kompetente;• Komunikacioni do të rregullohet në manerë të sigurt. Do të sigurohet siguri për kembësoret duke rregulluar rrugë të sigurt kalimi.• Shenjat për siguri dhe rregullim të komunikacionit do të përdoren në mënyrë adekuate.

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

B. Renovimi I objektit	Menaxhimi me materijale	<ul style="list-style-type: none"> • Nuk do te shfrytezohen materijale te reja qe permbajn azbest. • Agregat I forte ne beton I cili perdoret per rehabilitim duhet te pershtatet me kushtet e qendrueshmeris dhe gradacionit. Perberesi patjeter te jete I paster (te mos jete perdor me pare) dhe mundesisht I prodhuar lokalisht. • Resurset minerale (perberes, zalle, etj) te furnizohen vetem nga kompanite e autoprizura me koncesione valid. Kompanite patjeter te vertetojn se masat per SdheSH dhe menaxhim me ambientein do te zbatohen.
	Sigurimi I bashkesis	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi I sigurise se shfrytezuesve psh sigurimi rrugeve kaluese. • Informimi ne kohe I shfrytezuesve, hapsirave dhe bashkesive ne aferi per punet ne vijueshmeri. • Ne raste te nderprerjes se komunikacionit, organizimi I rrugeve alternative ne bashkepunim me komunet.
C. Nderimi I vogel	Menaxhimi me materijale	<ul style="list-style-type: none"> • Nuk do te shfrytezohen materijale te reja qe permbajn azbest. • Agregat I forte ne beton I cili perdoret per rehabilitim duhet te pershtatet me kushtet e qendrueshmeris dhe gradacionit. Perberesi patjeter te jete I paster (te mos jete perdor me pare) dhe mundesisht I prodhuar lokalisht. • Resurset minerale (perberes, zalle, etj) te furnizohen vetem nga kompanite e autoprizura me koncesione valid. Kompanite patjeter te vertetojn se masat per SdheSH dhe menaxhim me ambientein do te zbatohen.
	Erozioni I tokes	<ul style="list-style-type: none"> • Automjetet dhe maqinerite mund te parkohen, lahen dhe mirembahen vetem ne vende te caktuara ne siperfaqe qe nuk leshon me system epr grumbullim dhe eprpunim (separues per vajra) • Mbrojtja nga perhapja e sendimenteve me gardhe dhe pengesa • Eksploatoni token vetem sipas nevojës dhe ruani / zëvendësoni dhe ripërdorni pas ndërtimit. • Nuk lejohet perdorimi I antifirizit dhe akseleratoreve. • Mbrojtja dhe riperterrirja e siperfaqeve te pandertuara. Ndertimi ui objekteve mbrojtese per tu ul ne minimum reziku.

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Lista e masave per kontroll dhe zbutje		
		<ul style="list-style-type: none"> • Bërja e punës në një kullim sipërfaqësor për shmangien e ujit të shiut që do të dëmtonte tokën • Aplikimi i menaxhimit të ujit të stuhisë për të minimizuar erozionin dhe shpërndarjen e sedimenteve jashtë ujërave pritëse. • Parkimi te behet vetem ne vendet e shenuara.
	Sigurimi I bashkësis	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi I shfrytëzuesve dhe objekteve psh. Ndertimi I kalimit dhe mbrojtja nga matrialet qe mund te bien • Infomimi ne kohe I shfrytëzuesve ye hapsirave dhe bashkesite ne afersi per pune qe do te realizohen ne vijueshmeri. • Ne rast se komuniakacioni nderpritet do te organizohen rruge alternative ne bashkpunim me komunën.
D. Materijale te rrezikshme	Menaxhimi I mbeturinave te asbestit dhe shufrave per mbrojtje nga rrufeja	<ul style="list-style-type: none"> • Nese ne punetori gjendet asbest , do te informohet inspektorati I ambientit jetesor dhe organet tjera kompetente dhe do te kerkohej udhezime. Azbesti duhet te largohet ose trajtohet ne menuren adekuate • Abesti do te largohet, kontrollohet, transportohet dhe largohet ne pajtim me legjislacionet nacionale dhe praktikant me te mira • Punetoret qe punojn me azbestmbajn costume mbrojtese dhe maske te perstatshme (ne mvaresi prej llojit te azbestit. • Vetem kompani te autorizuar mund te angazhohen per menaxhim me azbestin. • Azbesti I larguar nuk guzon te shfrytëzohet perseri • Nese indentifikohet bare radioactive vetem kompani te autorizuar duhet te angazhohen per largimin e te njejtavee.
	Menaxhimi me material toksike, material te fortatë rrezikshme dhe lengje	<ul style="list-style-type: none"> • Te sigurohen ne menyre te drejte mjetet per vajosje, derivate te naftes dhe tretesit. • Deponim I perkohshem I lokacionit te te gjitha materijaleve te rrezikshme dhe toksike ne kontanjer te nenvizuar me detajet e perrberesve dhe udhezim per menaxhim me te njejtate. • Cte gjitha materijalet e rrezikshme duhet te rruhen ne kontenejer te ngjishur dhe te parandalohet rrjedhja e te njejteve. Ky kontejner duhet te kete system sekundar per mbajtje, psh du dhomes.

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

		<ul style="list-style-type: none"> • Kontejneret me materijale te rrezikshme duhet te rruen te mbyllur, pervecse ne rast te dorezimit dhe largimit te materialit te rrezikshem. Nuk duhet te perdoren, happen ose rruhen ne menyre qe con ne rrjedhejn e te njejteve. • Kontejneret qekan material djeges, te rrezikshem ose reaktiv patjeter te mbahen ne distance prej 15m nga prona e objektit dhe minimum 30m nga ujesjellesi. • Ombeturinat e rrezikshme do te grumbullohen, transportohen dhe largohen nga ana e kompanis se autorizuar me te cilen do te nenshkruhet kontrateme realizuaesin e puneve. Mbeturinat do te transportohen nga transportues me leje specijale dhe do te transportohen me kontajner te lejuar. Kontejneret me te gjitha mbeturinat e e rrezikshme duhet te nenvizohen ne menre adekuate. • Nuk do te shfrytezohen ngjyra vaji, asbest ose materijale te tjera qe jane te rreakshme pernjerezit
<p>DH. Furnizimi me hemikalje</p>	<p>Pamjaftueshmëria dhe mungesa e menaxhimit të duhur mund të rrisë rrezikun për mjedisin, mjedisi dhe siguria në punë, si dhe rreziku shëndetësor për të gjithë qytetarët</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hemikaljet menaxhohen dhe rruhen ne pajtueshmeri me LPBM • Hemikaljet furnizohen nga shites te autorizuar • Me hemikalje menaxhon personel I autorizuar dhe I trajnuar ne menyre adekuate.

Табела 3. Список за проверка на Мерки за ублажување

Pjesa 3:Plani I monitorimit							
Faza	Cka (Parametri do monitorohet)	Ku (A do monitorohet parametri?)	Si (A do monitorohet parametri?)	Kur (Definimii frekuencës/ose kontinuitetit)	Pse (A është duke u monitoruar parametri?)	Cmimi (Në qoftë se nuk është I përfshier në buxhet)	Kush (Është përgjegjës për monitorim?)
Gjatë përgatitjes së	Te gjitha lejet e nevojshem jane te siguruar pra fillimit te puneve	Ne drejtorit e qytetit	Kontrollimi I te gjitha dokumenteve	Para fillimit te puneve	Te sigurohen aspektligjore para nisjes se aktivitetet rekonstruuese	/	Realizues, mbikqyres, inspektor I ndertimit
	Njnoftohen instrucionet publike relevante	Hapsirat e realizuesit	Kontrollimi I te gjitha dokumenteve	Para fillimit te puneve	Te sigurohet vetedije e qytetareve	/	Realizues, mbikqyres
	Masa sigurie perpunetoret, te punesuarit dhe mysafiret	Ne vendndodhje	Kontrollim visual dhe dergimi I raportit	Para fillimit te puneve	Да се спречат ризици по здравјето и безбедноста – механички повреди и да се осигура безбеден пристап и мобилност	/	Realizues, mbikqyres
Gjate implimentimit	Rrjedhe s sigurt e komunikacionit	Ne vendndodhje	Kontrollim visual dhe dergimi I raportit	Gjste porosities se pajisjeve	Te sigurohet komunikacioni I koordinuar	/	Realizues, mbikqyres
	Безбедност на работа	Ne vendndodhje	Kontrollim visual dhe dergimi I raportit Kontrolle te pa paralajmeruara gjate	Kontrolle te pa paralajmeruara gjate punes	Te prandalohen riziqet per siguri dhe shendet ne pune–	/	Mbikqyres

Pjesa 3:Plani I monitorimit

Faza	Cka (Parametri do monitorohet)	Ku (A do monitorohet parametri?)	Si (A do monitorohet parametri?)	Kur (Definimii frekuencës/ose kontinuitetit)	Pse (A është duke u monitoruar parametri?)	Cmimi (Në qoftë se nuk është I përfshier në buxhet)	Kush (Është përgjegjës për monitorim?)
	Objekti eshte I organizuar mire, gjardhe, paralajmerime предупредувања, потпишување на поштенски	Ne vendndodhje	Inspektorati	Kontrolle te pa paralajmeruara gjate punes	Te parandalohen fatkeqesit	/	Realizues, supervisor
	Grumbulli mi dhe transporti I mbeturinae te rrezikshme (nese ka)	Ne lokacion te perkohshem ne punetori ne kontejner te posacem	Inspektim I listave transportuese dhe kshteve te hapsirave per deonim	Para transportimit te mbeturinave te rrezikshme (nese ka)	Te lehtesohen menaxhimi me mbeturinat nenivel local dhe nacional/Mbeturina te rrezikshme nuk do te hudhen ne deponi	/	Kompani e autorizuar, per grumbullim in dhe transportin e mbeturinave te rrezikshme), Inspektor I autorizuar komunal
	Grumbullim, transport dhe deponim final I mbeetjeve te forta	Ne dhe per reth objektit	Kontrollim visual dhe dergimi I raportit Kontrolle te pa paralajmeruara gjate punes	Ne nivel ditor dhe pas grumbullimite dhe hudhjes se mbeetjeve te	Moe leni mbeetje te forta qe te sigurohet shendeti dhe siguria e qytetareve	/	realizues; supervisor I puneve ndertimoren; inspektor I autorizuar ekologjik

Pjesa 3: Plani I monitorimit

Faza	Cka (Parametri do monitorohet)	Ku (A do monitorohet parametri?)	Si (A do monitorohet parametri?)	Kur (Definimii frekuencës/ose kontinuitetit)	Pse (A është duke u monitoruar parametri?)	Cmimi (Në qoftë se nuk është I përfshier në buxhet)	Kush (Është përgjegjës për monitorim?)
	Ndotja e ambientit, parametra e pluhurit	Ne dhe per reth objektit	Marrja e mostrave na insituvcione te autorizuar	Pas ankesave ose raportit negative te inspektoratit	Qe te mos kete emetim te pakontrolluar gjate punimeve	/	supervizor
	Niveli I zhurmes dhe vibracioneve	Ne dhe per reth objektit	Ndjekja e nivelit te zhurmes(me mjete speciale)	Pas ankesave ose raportit negative te inspektoratit	Qe te percaktohet se niveli I zhurmes a eshte ne nivel te selejuares	/	Realizues; Kompani e akredituar; inspector I autorizuar, inspector I ndertimit E
Gjate fazes se realizimit	Menaxhimi me mbeturina	Ne dhe per reth objektit	Mbeturinat ne menyre adeukate grumbulloh selektohen dhe deponohen	Ne nivel ditor	Te parandalohet grumbullimi I mbeturinave	E ndryshueshme dhe nuk eshte pjese e projektit	Kompani e autorizuar per grumbullimi e mbeturinave

Tabela 4

LISTË KONTROLLUESE E PLANIT PËR MENAXHIM SOCIAL DHE TË MJEDISIT
Lista Kontrolluese e PMSM Aneks 1: Informata të vendit (fotografi nga vend-ndodhja)
Lokacioni:



- ЛЕГЕНДА:
- Летна тераса-место на интервенција
 - Автопат Тетово-Скопје-Тетово
 - Река Вардар
 - Село Желино
 - Бензинска пумпа
 - Постоечки угостителски објект
 - - - Опфаг 226.00 m²

Aneks 2 Ministria e ambientit jetesor dhe planifikimit hapsinor (MAJPH) mendim/pelqim per elaborate per mbrojtje te ambientit jetesor



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Архивски број: П-4183/2

Дата: 10.08.2018

ДО: АГРОПОЛОГ-ВФС ДООЕЛ
Ул.Илирија бр.10
Општина Тетово

ПРЕДМЕТ: Доставување на мислење

ВРСКА: Ваш број 05-07/102 од 06.07.2018 година

Почитувани,

Во прилог на овој допис Ви доставуваме Мислење по ваше Известување за намера, кое се однесува за проект:Проширување на летна тераса на хотел, за потребите на АГРОПОЛОГ-ВФС ДООЕЛ од с.Желино-Тетово.

Со почит,

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Изработил: Благој Горгиев
Контролирал/Согласен: Александар Петковски
Директор на Управа за животна средина
Xhezmi Salbu



Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. "Тоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Архивски број: 11-4183/2

Дата: 10. 08. 2013

Почитувани,

Во врска со вашето Известување за намера, со цел аплицирање на проект: Локална и регионална конкурентност на Светска Банка, кое се однесува за проект: Проширување на летна тераса на хотел, за потребите на АГРОПОЛОГ-ВФС ДООЕЛ од с.Желино-Тетово, Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање Ви го доставува следното:

МИСЛЕЊЕ

Согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015 129/2015 и 39/2016), и Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина (Службен весник на Република Македонија бр. 74/2005, 109/2009 и 202/2016), Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина (Службен весник на Република Македонија бр.36/2012) и Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје (Службен весник на Република Македонија бр.32/2012), за горенаведениот проект **не треба** да се изготвува Елаборат за заштита на животна средина и не треба да се води постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Со почит,

Директор на
Управа за животна средина
Xhezmi Salij



Изработил: Благој Горцев
Контролирал/Согласен: Александар Петковски



Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. "Тоше Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс: (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk
